## SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET ORGANIZACIJE I INFORMATIKE V A R A Ž D I N

### **Tim Agroprog:**

Andro Krezić, 40011/11-R Tino Šimec, 40114/11-R Davorin Horvat, 39972/11-R Mario Milutin, 40044/11-R Petar Vrbek, 40131/11-R

## VELPRO VELEPRODAJA PROJEKTNI PLAN

# SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET ORGANIZACIJE I INFORMATIKE V A R A Ž D I N

## **VELPRO VELEPRODAJA**

#### PROJEKTNI PLAN

Nositelj kolegija:

Prof. dr. sc. Vjeran Strahonja

**Mentor:** 

mag.inf. Boris Tomaš

## Sadržaj

Izbor modela	1
Projektni tim	2
Terminski plan projekta	3
Proračun i budžet projekta	7
Ponuda naručitelju	8

#### Izbor modela

Tema našeg projekta je izrada aplikacije za veleprodaju tvrtke Velpro. Našom bi aplikacijom obuhvatili sve potrebne stavke za vođenje veleprodaje tvrtke. Ono što bismo mi omogućili našom aplikacijom je evidencija zaposlenika i naručitelja, stanja na skladištu, pregled narudžbi, pregled proizvda te možda još neke dodatne opcije vezane uz navedeno.

Model koji smo odabrali za izradu projekta i softvera je fazni model. Odabrali smo taj model jer prvo u planu imamo izradu cijele dokumentacije pa potrebne dijagrame za dokumentaciju te prema dijagramima i era modelu početi razvijati i nadograđivati aplikaciju. Na samom ćemo kraju testirati aplikacije, ispraviti moguće probleme te nadograđiti aplikacije.

## Projektni tim

U tablici 1. možete vidjeti sve članove projektnog tima te njihova zaduženja u izradi projekta.

### Tablica 1.


	ČLAN TIMA	ZADATAK
1.	Andro Krezić	Izrada era modela, dijagrama slučajeva korištenja te izrada dijela aplikacije i testiranje.
2.	Davorin Horvat	Izrada slučajeva korištenja te izrada dijela aplikacije i testiranje.
3.	Tino Šimec	Izrada dijagrama aktivnosti, pomoć pri izradi era modela te izrada dijela aplikacije i testiranje.
4.	Mario Milutin	Izrada specifikacije zahtjeva, podataka o provedbi projekta te izrada dijela aplikacije i testiranje.
5.	Petar Vrbek	Izrada projektnog plana i izrada dijela aplikacije i testiranje.

### Terminski plan projekta


Izrada plana u Microsoft Projectu odnosi se na sljedni prikaz naših akrivnosti i radnji te resursa kojeg smo koristili. Vremenski se prikazuje koji proces je koliko trajao i koji član tima je bio zadužen za koji dio projekta.

Prvo smo prikazali tablicu zadataka svakog člana tima te se u toj tablici može se vidjeti koliko je koji član radio koji dio projekta do sada i koliko bi još trebalo raditi da projekt bude u potpunosti ostvaren.


Slika 1.

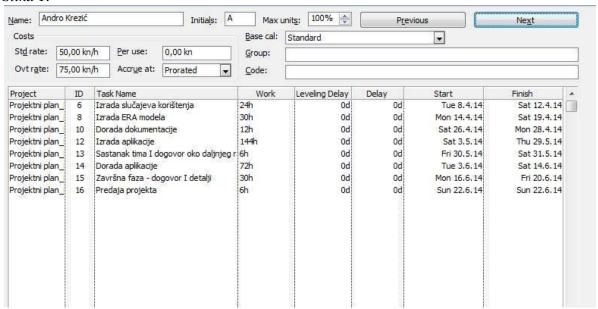


Slika 2.

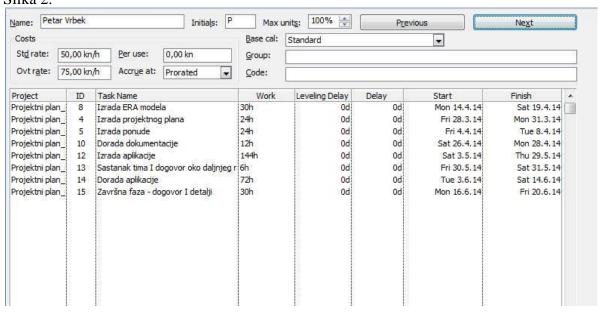


#### Slika 3.

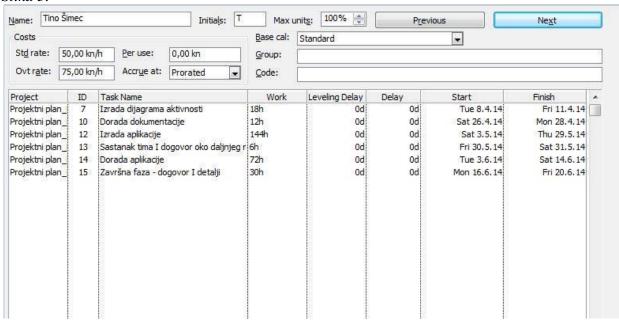


#### Slika 4.

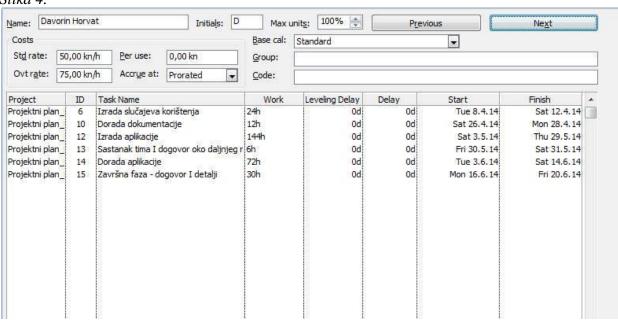


Slika 5.

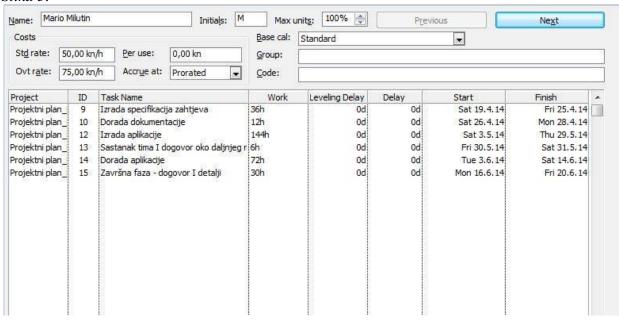

Na sljedećim slikama vidimo gantograme zadataka koji su se izvodili te koji resursi su bili korišteni i kako je projekt tekao te koliko je predviđeno da će projekt trajati za dovršetak projekta.

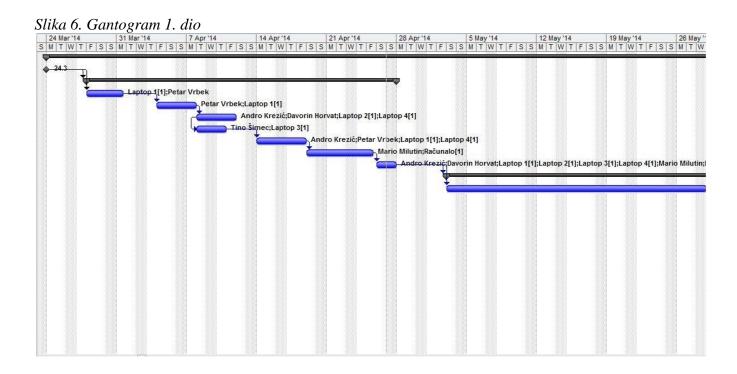

Slika 7. Gantogram 2. dio

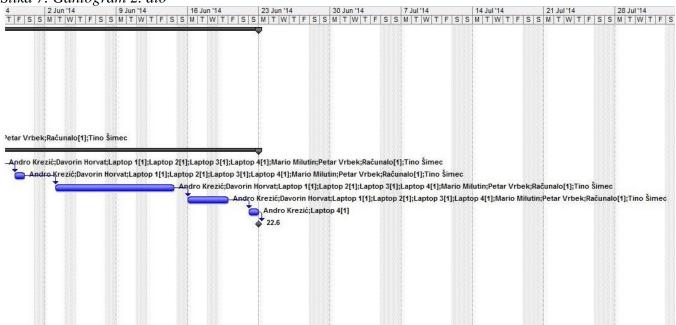

Na slici 8. prikazali smo satnicu svakog člana tima te troškove izvođenja samog projekta. Svaki član tima izvodi svoj dio posla po cijeni od 50,00 kn po satu rada te 75,00 kn po svakom prekovremenom satu rada. Za troškove računala uzeli smo cijenu od 8,00 kn po danu, te za laptop 12,00 kn po danu.

Slika 8. Cijene radnog sata

	Resource Name	Group	Max. Units	Peak	Std. Rate	Ovt. Rate	Cost	Work
1	Mario Milutin		100%	100%	50,00 kn/hr	75,00 kn/hr	15.000,00 kn	300 hrs
2	Andro Krezić		100%	100%	50,00 kn/hr	75,00 kn/hr	16.200,00 kn	324 hrs
3	Davorin Horvat		100%	100%	50,00 kn/hr	75,00 kn/hr	14.400,00 kn	288 hrs
4	Petar Vrbek		100%	100%	50,00 kn/hr	75,00 kn/hr	17.100,00 kn	342 hrs
5	Tino Šimec		100%	100%	50,00 kn/hr	75,00 kn/hr	14.100,00 kn	282 hrs
6	Laptop 1			0/day	12,00 kn		96,00 kn	8
7	Laptop 2			0/day	12,00 kn		72,00 kn	6
8	Laptop 3			0/day	12,00 kn		72,00 kn	6
9	Laptop 4			0/day	12,00 kn		96,00 kn	8
10	Računalo			0/day	8,00 kn		48,00 kn	6

## Proračun i budžet projekta

Proračun samog projekta također je izrađen u Microsoft Project alatu te nam je on prikazao približnu cijenu našeg projekta. Vrijednost projekta se izračunala prema radnim satima i cijeni koštanja radnog sata. Unosom satnice rada program nam je pokazao približnu cijenu projekta, odnosno cijenu projekta bez PDV-a pa bi naša ukupna vrijednost projekta bila 96.480,00 kn.

Budget Report as of Sun 27.4.14 Velpro Andro Krezić

ID	Task Name	Fixed Cost	Fixed Cost Accrual	Total Cost	Baseline	Variance
12	Izrada aplikacije	0,00 kn	Prorated	36.056,00 kn	0,00 kn	38.058,00 kn
14	Dorada aplikacije	0,00 kn	Prorated	18.056,00 km	0,00 kn	18.056,00 kn
15	Završna faza - dogovor I detalji	0,00 km	Prorated	7.556,00 km	0,00 km	7.556,00 kn
10	Dorada dokumentacije	0,00 kn	Prorated	3.056,00 km	0,00 kn	3.056,00 kn
8	Izrada ERA modela	0,00 km	Prorated	3.024,00 km	0,00 km	3.024,00 kn
6	Izrada slučajeva korištenja	0,00 kn	Prorated	2.424,00 km	0,00 kn	2.424,00 kn
9	Izrada specifikacija zahtjeva	0,00 km	Prorated	1.808,00 km	0,00 km	1.808,00 kn
13	Sastanak tima I dogovor oko daljnjeg r	0,00 kn	Prorated	1.556,00 kn	0,00 kn	1.556,00 kn
4	Izrada projektnog plana	0,00 km	Prorated	1.212,00 km	0,00 km	1.212,00 kn
5	Izrada ponude	0,00 kn	Prorated	1.212,00 km	0,00 kn	1,212,00 km
7	Izrada dijagrama aktivnosti	0,00 km	Prorated	912,00 km	0,00 km	912,00 km
16	Predaja projekta	0,00 kn	Prorated	312,00 km	0,00 kn	312,00 kn
2	POČETAK PROJEKTA	0,00 km	Prorated	0,00 km	0,00 km	0,00 kn
17	KRAJ PROJEKTA	0,00 kn	Prorated	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
	20	0,00 kn	-	77.184,00 kn	0,00 kn	77.184,00 km

## Ponuda naručitelju



Agroprog Tim, Pavlinska 2, 42 000 Varaždin

- Naručitelj: Velpro

- Sjedište: Ulica Vilka Novaka 48, 42 000 Varaždin

- **Tel** 042/401 - 160 - **Fax** 042/401 - 166

- **E-mail** <u>info@velpro.hr</u>

REDNI BROJ	NAZIV	CIJENA
1.	Izrada dokumentacije	23.072,00 kn
2.	Izrada aplikacije	54.112,00 kn
3.	PDV	19.296,00 kn
UKUPNO		96.480 kn

Potpis vođe projekta	Potpis kupca
